

Implantación de un ERP en la empresa

Unidad 4

Módulo – Sistemas de Gestión Empresarial
Implantación de un ERP en la empresa

Introducción	3
Sitios de ayuda para elegir un ERP	4
Fases de implantación de un ERP	5
<u>1. Primera fase. Diseño de la solución</u>	<u>7</u>
<u>2. Segunda fase. Estudio de infraestructura</u>	<u>7</u>
<u>3. Tercera fase. Desarrollo de la implantación (como proyecto)</u>	<u>7</u>
<u>4. Cuarta fase. Puesta en marcha y explotación</u>	<u>8</u>
Usabilidad	9
Evolución tras la implementación	9
Errores y costes ocultos	10

Introducción

La estructura de los mercados actuales exige a la mayoría de las empresas de cualquier tamaño y condición su adaptación a entornos tecnológicos que le permitan competir con otras que disponen de niveles altos de digitalización.

Por eso, existe un amplio nicho de negocio en el campo del desarrollo e implantación de sistemas de gestión empresarial del tipo ERP, ya que todas estas empresas, si quieren ser competitivas tendrán que adoptar este tipo de sistemas tan pronto como les sea posible.

Ya se ha comentado en capítulos anteriores acerca de la amplia **variedad de soluciones** que se pueden encontrar en la actualidad, también sobre las distintas modalidades de **licencia** y los **entornos** en los que se pueden utilizar, y sobre la conveniencia en algunos casos de realizar un **desarrollo propio**, lo que implica un trabajo previo de estudio, meditación y maduración para la toma de una decisión informada, pues esta determinará el éxito o el fracaso de la implantación del ERP en la empresa.

De hecho, suele ser tan complicado que no es extraño que las empresas opten por encargar a **consultoras** externas que analicen las necesidades de la empresa y emitan un informe final con las características y recomendaciones de implantación de un ERP, que permita a la gerencia tomar la decisión de adquirir una u otra aplicación entre las existentes en el mercado o desarrollarla.

Sitios de ayuda para elegir un ERP

Existen portales que comparan y analizan soluciones ERP:

- **SoftDoit:** genera informes y rankings según necesidades empresariales. <https://www.softwaredoit.es/index.html>
- **TEC (Technology Evaluation Center):** proporciona guías, whitepapers y comparativas de software. <https://www3.technologyevaluation.com/es>. Dispone de una herramienta itadvisor con la que comparar software a la que se accede mediante una cuenta gratuita <http://itadvisor.technologyevaluation.com>. De nuevo, escogiendo entre una serie de opciones, se obtiene un listado de posibles soluciones.
- **Software Advice:** portal generalista que también ofrece comparativas de BI, seguridad y comunicaciones. <https://www.softwareadvice.com>

Fases de implantación de un ERP

La implantación de un sistema ERP requiere de una serie de fases ordenadas, de seguimiento muy recomendable para asegurar la llegada a buen término del proyecto.

Desde el punto de vista del equipo consultor encargado, es fundamental conocer el perfil de empresa con la que se va a trabajar. No es lo mismo realizar una implantación para una multinacional que para una pyme, que normalmente cuenta con unos recursos más limitados. Además, la cultura empresarial, la política Interna, los procesos y sus flujos de información son sustancialmente distintos en ambos casos.

La implantación de un ERP es un proyecto ambicioso que normalmente revolucionará el día a día del negocio, con lo que eso supone de traumático.

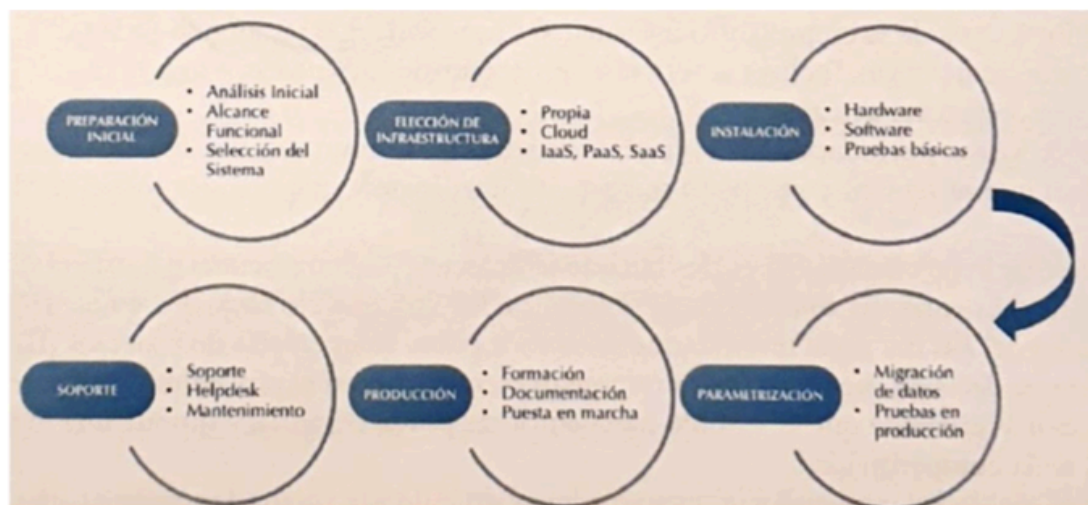


Figura 1. Fases de implantación de un ERP.

Para abordar una implantación de este tipo es imprescindible:

1. Un **análisis** previo que incluya un estudio de las necesidades detectadas, pero también una evaluación de los procesos empresariales utilizados en la actualidad.
2. La elección de la **plataforma**, propia o subcontratada, que se va a utilizar.
3. Una concreción del alcance funcional del **desarrollo**, donde se especifiquen los objetivos, habiendo escuchado a los departamentos que participan. Un proyecto particularizado del desarrollo de software y parametrizaciones necesarias si se hubiera optado por el desarrollo, o una elección adecuada de los módulos que se van a instalar y las personalizaciones necesarias en el caso de optar por soluciones existentes en el mercado.
4. Un proceso de **instalación y configuración** del nuevo sistema. La **importación/migración** desde los sistemas anteriormente utilizados, de los datos históricos de la empresa, si los hubiera. Un seguimiento y control estricto de la consecución de todos los objetivos que inicialmente se habían fijado, con especial atención a los elementos críticos para la rentabilidad del proyecto.
5. Una etapa de finalización del proyecto con la elaboración de baterías de **pruebas** de funcionamiento y rendimiento, la elaboración de **documentación** variada y la **formación** de usuarios.
6. **Soporte y mantenimiento.**

A continuación se muestran las fases de una implantación

1. Primera fase. Diseño de la solución

- **Analizar** procesos de negocio, estructura de información y flujo de datos.
- Detectar necesidades y oportunidades de mejora.
- Reingeniería de procesos (BPR) si el ERP requiere adaptar procedimientos.
- Definir alcance funcional y requisitos:
 - ✓ Funcionales: lo que debe hacer el sistema.
 - ✓ No funcionales: calidad, seguridad, rendimiento, disponibilidad.
 - ✓ Reglas de dominio: accesos, normativas legales.
- Selección del sistema: ERP existente con personalización o desarrollo propio.

2. Segunda fase. Estudio de infraestructura

- Revisar la **infraestructura** IT para soportar el ERP.
- Se recomienda el uso de modelos de pago por uso: **IaaS, PaaS, SaaS**, que facilitan accesibilidad y reducen inversión inicial.

3. Tercera fase. Desarrollo de la implantación (como proyecto)

- Planificación del **desarrollo** de tareas, **instalación** de hardware/software y **configuración** del sistema.
- **Migración** de datos históricos: esencial para no mantener sistemas antiguos simultáneamente.

4. Cuarta fase. Puesta en marcha y explotación

- **Pruebas finales:**
 - ✓ Paralelas: ambos sistemas operando para verificar resultados.
 - ✓ Bloqueo del sistema antiguo: arranque del ERP directamente.
- **Formación** de usuarios y administradores.
- **Documentación** técnica y de usuario: crucial para soporte futuro y continuidad.
- ERP Open Source: puede requerir personalización, creación de vistas, informes y desarrollo de nuevos componentes.
- **Soporte y mantenimiento:** necesario para adaptarse a cambios técnicos, normativos y resolver incidencias.

Usabilidad

- La usabilidad mide la facilidad, eficiencia y satisfacción del usuario.
- ERP modernos: interfaz clara, intuitiva, adaptable a móviles y tabletas.
- Características clave:
 - ✓ Personalización de pantallas, menús e informes.
 - ✓ Sistemas de búsqueda potentes.
 - ✓ Procesos de alta sin cambiar de pantalla.
 - ✓ Avisos de actividad, ayuda contextual y consistencia de la interfaz.

Evolución tras la implementación

- Tras la implantación de un ERP las empresas Inicialmente pueden disminuir la eficacia (fenómeno **performance dip**).
 - ✓ Usuarios necesitan tiempo para adaptarse al nuevo entorno.
- Las limitaciones del ERP reflejan decisiones empresariales para asegurar cumplimiento de procesos.
 - ✓ El ERP se convierte en el instrumento que garantiza que los empleados siguen las reglas del negocio marcadas por la gerencia, puesto que las limitaciones que parece imponer son simplemente decisiones de negocio
- La implementación es continua: nuevos módulos, parametrizaciones, actualizaciones.

Errores y costes ocultos

Es proverbial la creencia generalizada de que la implantación de sistemas de información gerencial se convierte en muchas ocasiones en proyectos fracasados, si no traumáticos, o que experimentan grandes retrasos y sobrecostes.

A veces, esto está provocado por los conflictos surgidos entre proveedor y cliente, o por la poca implicación de los mandos intermedios, o por la falta de cualificación del personal encargado de la parte del cliente, o por una conjunción de varias de ellas.

Pero uno de los mayores errores cometidos históricamente en el desarrollo de proyectos relacionados con la implantación de un sistema de gestión empresarial es el de la no superación de la barrera de entrada colocada por los usuarios.

No "vender" bien el proyecto internamente puede ser un motivo de fracaso seguro. Si los estamentos de cualquier nivel no están implicados, los problemas esperados al abordar cualquier cambio en una organización se multiplicarán exponencialmente y harán peligrar la llegada a buen puerto del proyecto.

Factores que generan fracaso:

A tener en cuenta:

Relación no exhaustiva de errores habituales que provocan el fracaso en la implantación de un ERP en la empresa:

- Contratación de partner no cualificado para el desarrollo o la implementación.
- Elección errónea del software.
- Implementación equivocada sin reingeniería de procesos de negocio.
- Enfoque del proyecto fundamentalmente técnico en lugar de empresarial.
- Expectativas irreales.
- Objetivos indefinidos y responsabilidades diluidas.
- Ausencia de liderazgo.
- Defectuosa gestión del cambio.
- Comunicación o ineficaz o ausente.
- Elección errónea de los *key users*.
- Baja implicación de los usuarios.
- Falta de motivación y resistencia al cambio de los usuarios.
- Dificultad de formación de los usuarios.

La implantación suele ser larga y percibida como interminable, especialmente cuando se agregan nuevos módulos gradualmente.

Todo proyecto que aspire al éxito debe evitar el incumplimiento de los plazos previstos, no superar desproporcionadamente el presupuesto asignado y, por descontado, evitar presentar un funcionamiento no esperado.

Hay que considerar que parte de la organización (no solo la parte externa que ayude en el proceso) se verá involucrada y esto afectará a la productividad de sus integrantes.

Unidad 4

La implementación de un ERP suele, con frecuencia, dar la impresión de no acabar nunca, de convertirse en un proyecto al que no se le ve el fin. Pero, dejando al margen los proyectos fallidos, la razón de ello suele ser que se implementa inicialmente un conjunto de módulos y, paulatinamente, se abordan ampliaciones que suponen la integración de nuevos módulos.

